

**Информация о реализации кредитного соглашения
с Европейским банком реконструкции и развития.**

Кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о софинансировании Проекта развития коммунальных служб города Сургута было подписано 21 июня 2002 года. Совокупный бюджет Проекта составляет 2 971 млн. руб., в том числе кредит ЕБРР в размере 1 650 млн. руб.

Всего освоено с начала реализации Проекта с учетом средств бюджета города на отчетную дату (1 апреля 2010 года) - 2 млрд. 818 млн. руб. ✓

Всего за период реализации Проекта развития коммунальных служб города Сургута по состоянию на 1 апреля 2010 года выбрано средств ЕБРР на общую сумму 1 563,50 млн. рублей. ✓

Всего за период реализации Проекта произведено 23 выборки средств ЕБРР:

Транш А: 130,4 млн.руб. (на обеспечение процесса закупок, подготовку концептуального проектирования, техническое управление контрактами);

Транш В: 894,9 млн.руб. (на восстановление канализационных коллекторов в Восточном жилом районе и по ул. Майской; расширение водозабора 9-го промузла; на замену насосов на ГКНС; на реконструкцию водозабора п.Аэропорт).

Транш С: 538,1 млн. руб. (на реконструкцию ЦТП; на реконструкцию магистральных теплотрасс; на установку ИТП; на установку общедомовых узлов учета).

Анализ выборки кредитных средств в разрезе по траншам по состоянию на 1 апреля 2010 приведен на рисунке № 1.

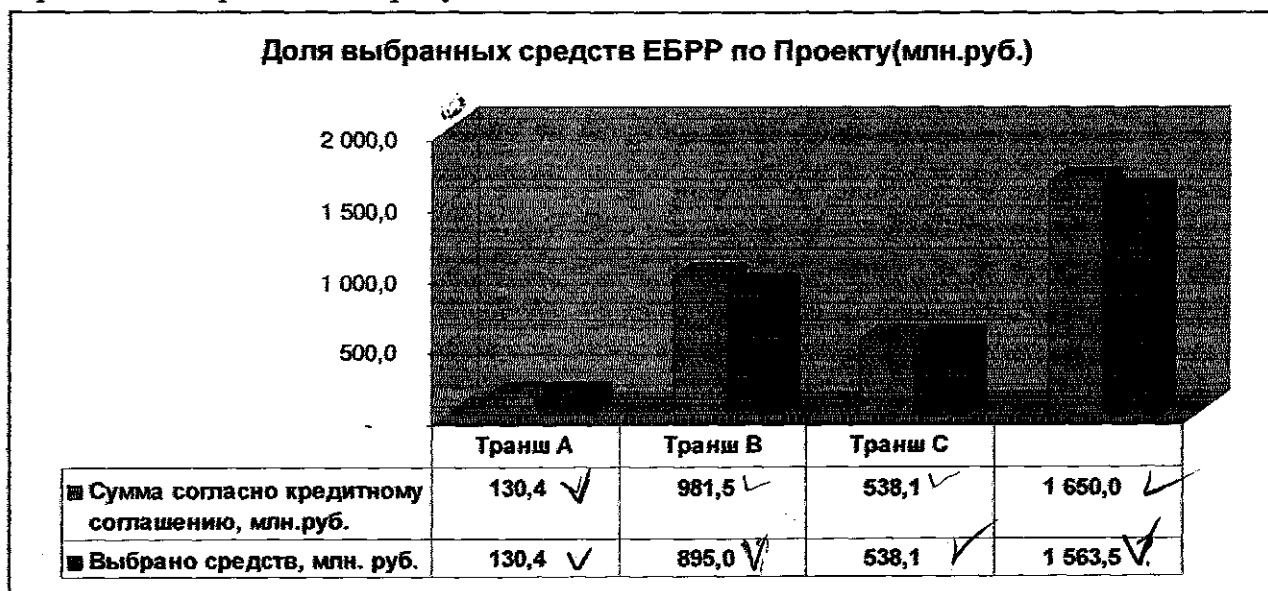


Рисунок №1. Анализ выборки средств ЕБРР по состоянию на 1.04.2010 г.

Средневзвешенная процентная ставка за период пользования кредитом ЕБРР с 2004 года по 01.04.2010 года составила 11,21 %. С 16.12.2009 г. по кредитному договору с ЕБРР от 21.06.2002 г. применяется механизм фиксации процентных ставок.

По состоянию на 1 апреля 2010 г. в реализации находится контракт J3 «Реконструкция канализационного коллектора». Данный контракт предусматривает реконструкцию участков коллектора по ул. Ленина общей протяженностью 2 702 м методом сварки и протаскивания полиэтиленовых труб внутри существующего коллектора с заполнением пенобетоном межтрубного пространства.

Ход реализации контракта J3 «Внешние инженерные сети. Лот 3. Реконструкция канализационного коллектора».

Контракт J3 «Внешние инженерные сети. Лот 3. Реконструкция канализационного коллектора» заключен 04 сентября 2009 года.

Подрядчик: Консорциум в составе: ООО «Специализированное карьерное управление», ООО «Специализированное управление – 57» и ООО «Предприятие по строительству и ремонту подземных коммуникаций». Основной партнер – ООО «СКУ».

Состав работ: Реконструкция 3-х участков коллекторов и сопутствующих соединений по бестраншейной технологии с протаскиванием полиэтиленовых труб общей длиной 2 702 м по ул. Ленина города Сургута.

По контракту J3 выполнены следующие работы:

участок № 1 «Сети канализации (самотечный коллектор), ул.Магистральная», «самотечный канализационный коллектор к больничному комплексу мкрн.5 (по пр.Ленина) общей длиной 971 м»:

Выполнены очистка и ремонт коллектора с затягиванием полиэтиленовой трубы Ду 800 мм протяженностью 565 п.м. и трубы Ду 1200 мм протяженностью 64 п.м.

Начаты работы по заливке раствором межтрубного пространства на участках КК3-ТК-2 и ТК2-КК1.

Произведена очистка магистрального коллектора от КК1* до КК4*. Произведен демонтаж временного коллектора перекачки от КК6 до ТК3 и демонтирован временный городок на ТК2. Смонтирован напорный трубопровод временной перекачки Ду 400 мм от КК1* до КК4* (маг.Меркурий) и переходы-переезды через трубопровод, смонтированы насосы, станции управления. Начаты работы по сварке трубы ПЭ Ду 1200 мм на участке КК1* до КК3 (маг.Эльдорадо).

Материалы (п/э труба) закуплена на весь участок коллектора.

участок № 2 «Межквартальные канализационные сети. Канализационный коллектор № 2 (по пр.Ленина) общей протяженностью 567 м»:

Произведена очистка и ремонт коллектора с затягиванием полиэтиленовой трубы Ду 630 мм от КК33 до КК40 общей протяженностью 80 м.п.(с нагнетанием цементного раствора в межтрубное пространство) и от КК33 до КК43.

Выполнена санация колодцев КК40, КК33, КК41 полиэтиленовыми трубами.

Материалы (п/э труба) закуплена на весь участок коллектора.

участок № 3 «Межквартальные сети канализации по пр.Ленина общей протяженностью 781 м», «Сети канализации(самотечный коллектор) по ул.Магистральная» общей протяженностью 383 м»:

Смонтирована полиэтиленовая труба Ду 1000 мм от КК9 до ТК1 общей протяженностью 234 п.м.

Выполнена очистка коллектора на участке КК3 до КК7 общей протяженностью 100 п.м. Выполнено устройство монолитного участка в ТК2. Выполнена шурфовка существующих коммуникаций в районе ТК4 и участка подземной прокладки временного подземного напорного коллектора (прокол под ул.Кукуевецкого).
На участке по ул.Магистральная ведутся подготовительные работы.

Всего освоено капитальных вложений по контракту J3 по состоянию на 01.04.2010 года 82 455,66 тыс.рублей (или 38,47% от общей стоимости контракта).

И.о.директора Департамента
городского хозяйства
Администрации города

В.И.Кошуг

Исп. ОАО «Югра-консалтинг»
Болсун В.А.
