

Информация

о выполнении решения, принятого на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 21.05.2019 по вопросу, касающемуся реализации «дорожной карты» по обеспечению парковочными местами учреждений здравоохранения ХМАО – Югры, находящихся на территории города Сургута (на ПК-64/9 от 19.09.2019)

В целях обеспечения парковочными местами учреждений здравоохранения ХМАО – Югры, находящихся на территории города Сургута, в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года» в проекте бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрены бюджетные ассигнования всего в размере 55 726 922,06 рублей, в том числе в 2020 году 10 078 542,06 рублей, в 2021 году 6 003 250 рублей, в 2022 году 39 645 130 рублей. Средства предусмотрены для выполнения работ на объектах:

БУ ХМАО – Югры «СГКП № 2» (9 машино-мест),
БУ ХМАО – Югры «СКПНБ» (30 машино-мест),
БУ ХМАО – Югры «СГСП № 2» (10 машино-мест),
БУ ХМАО – Югры «СГСП № 1» (6 машино-мест),
БУ ХМАО – Югры «СГСП № 4» (31 машино-место).

Разработана проектно-сметная документация по 4 объектам с целью дальнейшего строительства: «Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина, г. Сургут», «Автомобильная парковка №2 БУ ХМАО – Югры» ОКД «ЦД и ССХ» г. Сургут», «Автомобильная парковка БУ ХМАО – Югры «СГКП № 5» ул. Островского, 15 г. Сургут», «Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений ул. Энергетиков, 14 г. Сургут».

В 2019 году осуществляется строительство следующих объектов: «Автомобильная парковка № 2 БУ ХМАО – Югры «ОКД «ЦД и ССХ» г. Сургут», «Автомобильная парковка БУ ХМАО – Югры «СГКП № 5» ул. Островского, 15 г. Сургут».

В проект бюджета включены средства на 2020 год для строительства объекта «Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений по ул. Губкина, г. Сургут».

Строительство объекта «Автомобильная парковка вблизи медицинских учреждений ул. Энергетиков, 14 г. Сургут» будет осуществляться в рамках реконструкции ул. Энгельса в период 2021-2022 годов.

Средства для разработки проектно-сметной документации и дальнейшего строительства включены в проект бюджета на 2021-2022 годы по объектам: Автомобильная парковка «БУ ХМАО – Югры «СГКП № 2», ул. Федорова, 69 г. Сургут», «Автомобильная парковка БУ ХМАО – Югры «СКПНБ», ул. Юности, 1, г. Сургут», «Автомобильная парковка БУ ХМАО – Югры «СГСП № 2», пр. Советов, 3, г. Сургут», «Автомобильная парковка БУ ХМАО – Югры «СГСП № 1», ул. Пушкина, 5/1, г. Сургут», «Автомобильная парковка БУ ХМАО – Югры «СГКП № 4», пр. Набережный, 41, г. Сургут».

В 2019 году завершены работы по строительству объекта «Автостоянка для объекта социальной сферы по улице Рабочая в микрорайоне №19».

Справочная информация по строительству двух парковок по состоянию на 30 октября прилагается.

О фактическом и требуемом количестве парковочных мест в соответствии с нормативами градостроительного проектирования для всех объектов, находящихся и строящихся на территории БУ «СОКБ» (с графическим отражением машино-мест пообъектно, разрешительной документацией), сообщаем следующее.

Ранее (2016-2017 г.г.) департаментом архитектуры и градостроительства на основании сведений о численности персонала и количестве посетителей, предоставленных медицинскими учреждениями города, была проведена работа по определению соответствия нормативному количеству парковочных мест для обслуживания объектов здравоохранения фактического количества существующих автостоянок, а также возможности увеличения количества дополнительных парковочных мест для персонала в границах территорий медучреждений.

По информации, полученной от БУ «СОКБ», на сегодняшний день на территории БУ «СОКБ» обустроено 136 парковочных мест для нужд сотрудников и посетителей, с учетом мест парковки маломобильных групп населения. Ежедневно в приемные отделения обращаются более 300 человек. Проезжают на территорию до 100 машин городской станции «Скорой помощи» для доставки пациентов, нуждающихся в оказании экстренной и неотложной медицинской помощи. Ежедневно на стационарном лечении находится около 100 пациентов из других территорий автономного округа, чаще всего приезжающих на личном транспорте. Ежедневно на территории паркуются до 50 машин пациентов, получающих процедуру гемодиализа при хронической почечной недостаточности (а таких на учете около 150 человек).

Нуждающиеся в парковочных местах пациенты обеспечены ими в полном объеме.

На территории учреждения размещены другие организации: Сургутский филиал окружного бюро «Судебно-медицинская экспертиза, ООО «Северный похоронный дом», филиал окружного «Центра медицины катастроф», кафе «Калибри», также через КПП проезжает около 30 машин в гаражи ООО «ЭКО Мир», обслуживающие организацию АО «Тюменьэнерго».

Для разрешения ситуации, связанной с нехваткой парковочных мест, на прилегающей к лечебному учреждению территории для увеличения числа парковочных мест запланировано благоустройство гостевой автостоянки на 105 парковочных мест в рамках реконструкции консультативно-диагностической поликлиники на 425 посещений в смену, которая в настоящее время уже обустроена.

В рамках решения вопроса по выделению средств на ремонт проезда от травматологии до реабилитационного центра в проекте бюджета предусмотрены средства на проектирование и строительство объекта:

«Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургуте». В 2021 году для оплаты проектно-изыскательских работ предусмотрены средства в размере 1 391 950 рублей, в 2022 году для оплаты строительно-монтажных работ в размере 22 668 890 рублей. Ориентировочная стоимость строительства проезда составляет 24 060 840 рублей.

По вопросу возможности организации пешеходного перехода к зданию Станции скорой медицинской помощи сообщаем, что в адрес филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети был направлен запрос о согласовании схемы размещения тротуара возле БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» по ул. Профсоюзов, 29. По устной информации, полученной от сотрудника филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети, в согласовании отказано.


Директор департамента архитектуры
и градостроительства – главный архитектор



С.В. Солод


СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы города



Н.Н. Кривцов

Приложение 1 БУ "Сургутская окружная клиническая больница"

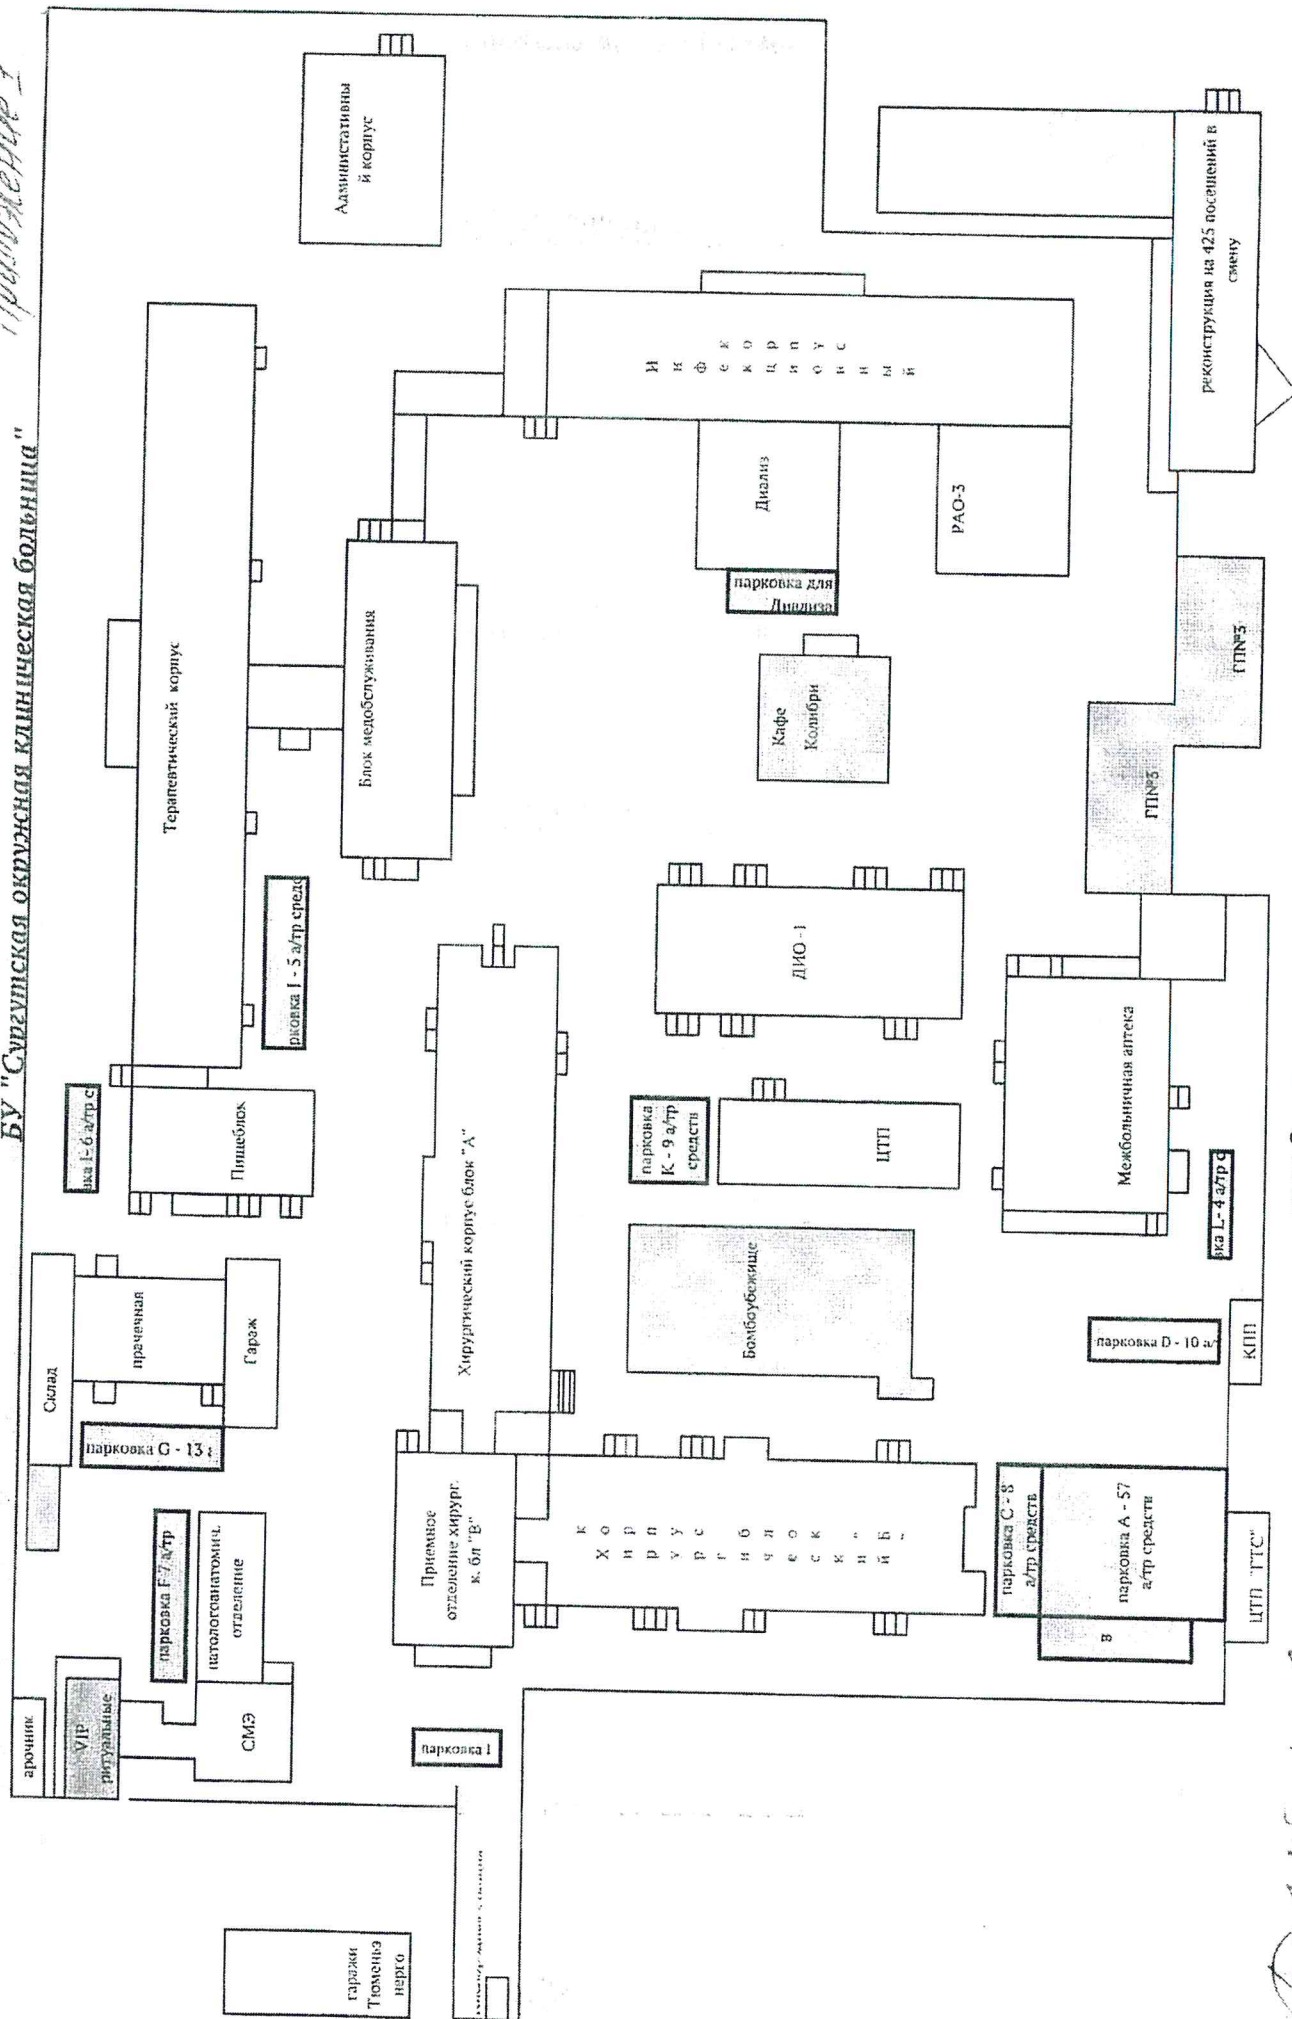

улица Энергетиков

Генеральный директор

Справочная информация по строительству
на " 30" октября 2019 года

Объекта «Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры «СГКП № 5», ул. Островского, 15,
г.Сургут»,
(полное наименование)

Адрес (месторасположение) объекта ХМАО-Югра, г. Сургут, мкр.13"А", ул. Островского
(муниципалитет/населенный пункт, улица, дом)

Наличие системы видеонаблюдения -
(краткие характеристики, режим работы)

Основание для реализации "Развитие транспортной системы города Сургута на период
до 2030 года"

Источники финансирования (наименование государственной/муниципальной программы)

Наименование	Стоимость СМР по МК № 24/2019 от 02.09.2019
ВСЕГО	1 298 098,98
2019 год	1 298 098,98

Сроки реализации (с указанием объемов финансирования ПИР, СМР и по годам)
ПИР - 2018; СМР - с 02.09.2019 по 31.10.2019
(с указанием сроков ПИР, СМР)

Заказчик (Застройщик) МКУ "Управление капитального строительства",
Никитин Владимир Сергеевич., тел. +7 (3462) 55 00 90

Проектировщик (наименование, Ф.И.О. руководителя, контакты)
ООО "Зодчий", Каликин Александр Владимирович,
тел. +7 (3462) 78-44-42, Муниципальный контракт от 28.08.2018 № 14П/2018
(наименование, Ф.И.О. руководителя, контакты, реквизиты контракта*)

Генеральный подрядчик ООО «КВАЛИТИ-СТРОЙ», Когут Вадим Григорьевич
тел. +7 (3462) 55-01-03, муниципальный контракт от 02.09.2019 № 24/2019
(наименование, Ф.И.О. руководителя, контакты, реквизиты контракта*)

Субподрядчики -
(вид работ, наименование, Ф.И.О. руководителя, контакты, реквизиты контракта*)

Направлена заявка в Департамент архитектуры и градостроительства для получения разрешения на производство земляных работ №43-02-2585/9 от 27.09.2019. Проектная и рабочая документация передана ООО «КВАЛИТИ-СТРОЙ» от 04.09.2019. Площадка под строительство передана по акту приема-передачи 24.09.2019. В адрес подрядчика направлены все согласования на производство земляных работ от эксплуатирующих организаций №43-02-2672/9 от 04.10.2019. Решается вопрос по поставке и монтажу дорожных знаков и ограждения.

(соответствие графика производства работ, численность задействованного персонала, краткое описание выполняемых работ)

Таблица 1 "Готовность объекта"

№ п/п	Наименование видов работ	Готовность, %
1.	Подготовительные работы	100
2.	Вертикальная планировка	100
3.	Дорожные одежды	100
4.	Озеленение	0
5.	Организация дорожного движения	100
6.	Ограждение	0
7.	Временные здания и сооружения	100

Общая готовность объекта - 92%

Исп. Главный специалист ОСК
Э.Г. Саргатов

Справочная информация по благоустройству
на "30" октября 2019 года

Объекта Автомобильная парковка №2 БУ ХМАО-Югры "ОКД "ЦДиССХ" в г. Сургуте
(полное наименование)

Адрес (месторасположение) объекта Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 5-5А, ул. Ленина, 69, 73
(муниципалитет/населенный пункт, улица, дом)

Наличие системы видеонаблюдения -
(краткие характеристики, режим работы)

Основание для реализации Муниципальная программа "Развитие транспортной системы на период до 2030 г.

Источники финансирования (наименование государственной/муниципальной программы)

Наименование	Стоимость СМР по МК № 25/2019 от 10.09.2019
ВСЕГО	1 695 910,34
2019 год	1 695 910,34

Сроки реализации (с указанием объемов финансирования ПИР, СМР и по годам)
ПИР - 2019; СМР - с 10.09.2019 по 31.10.2019
(с указанием сроков ПИР, СМР)

Заказчик (Застройщик) МКУ "Управление капитального строительства",
Никитин Владимир Сергеевич., тел. +7 (3462) 550-090
(наименование, Ф.И.О. руководителя, контакты)

Проектировщик ООО "Зодчий", Каликин Александр Владимирович,
тел. +7(982) 508 94 68, Муниципальный контракт от 12.07.2018 № 09П/2018
(наименование, Ф.И.О. руководителя, контакты, реквизиты контракта*)

Генеральный подрядчик ИП Наумов Павел Игоревич
тел. +7 (900) 3866252, муниципальный контракт от 10.09.2019 № 25/2019
(наименование, Ф.И.О. руководителя, контакты, реквизиты контракта*)

Субподрядчики -
(вид работ, наименование, Ф.И.О. руководителя, контакты, реквизиты контракта*)

Выполнены работы по устройству вертикальной планировке, асфальтовому покрытию парковки и тротуара, осуществлен закуп ограждения, установлены знаки дорожного движения

(соответствие графика производства работ, численность задействованного персонала, краткое описание выполняемых работ)

Таблица 1 "Готовность объекта"

№ п/п	Наименование видов работ	Готовность, %
1.	Подготовительные работы	100
2.	Вертикальная планировка	100
3.	Дорожная одежда	100
4.	Озеленение	10
5.	ОДД	75
6.	Ограждение	0

Готовность объекта - 87%

Подрядная организация сорвала сроки выполнения работ, завершение работ (установка металлического ограждения) планируется до 06.11.2019

Исп. Главный специалист ОКР
Е.А. Деместьев



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
ГОРОДА СУРГУТА**

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462) 52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru



105763 231101
№ 18-02-2050/9
от: 18/09/2019

О направлении протокола заседания
постоянного комитета Думы города
по социальной политике

Направляю копию протокола заседания постоянного комитета Думы города по социальной политике, которое состоялось 11.09.2019.

В рамках организации работы исполнительного органа муниципального образования прошу предоставить информацию о выполнении поручений депутатов, данных на заседании.

Приложение: на 15 листах в 1 экз.

Заместитель Председателя Думы

А.М. Кириленко

Сахарова Елена Владимировна
тел. (3462) 52-81-74

И.о. главы Администрации
города Сургута
А.А. Жердеву

Депутатам Думы города

Председателю Контрольно-
счетной палаты
В.И. Жукову

Прокурору города Сургута
старшему советнику юстиции
Л.А. Балину
